

**Procès-verbal de la Réunion
du Comité d'Etablissement
TLD EUROPE de Montlouis
Le vendredi 20 juin 2014 à 10h00**

Etaient présents

Sébastien PARKINSON	Président du CE	
Valérie DOUSSON	RRH	
Olivier BRIER	Membre Titulaire/Secrétaire du CE	1 ^{er} collègue
Richard CAILLAUD	Membre titulaire	1 ^{er} collègue
Franck COUE	Membre titulaire	1 ^{er} collègue
Jérémy PHILLIPPART	Membre titulaire	1 ^{er} collègue
Dominique VOUTIER	Membre suppléant	1 ^{er} collègue
Laurent MAUDET	Membre suppléant	1 ^{er} collègue
Jérôme DEBOURG	Membre suppléant	1 ^{er} collègue
Guillaume DUBOIS	Membre titulaire	2 ^{ème} collègue
Philippe HERVET	Membre suppléant	2 ^{ème} collègue
Thierry LEON	Membre titulaire	3 ^{ème} collègue
Jocelyn Louise	Représentant syndical CGT au CE	

Information du Comité d'établissement de Montlouis sur Loire concernant le calendrier
du transfert anticipé des activités de production.

Contexte

Le CE a été informé le 22 avril 2014 qu'afin d'adresser les opportunités de croissance qui se présentent aujourd'hui pour MTL, et qui se traduisent par des problématiques évidentes de manque de place sur MTL, la direction envisageait un scénario de transfert de la BU MTL vers SOR de façon anticipée début 2015. Pour ce faire, nous nous appuyons sur la livraison 1 mois en avance du bâtiment SOR, et le décalage de la commercialisation du DTV. Ce transfert est aussi l'opportunité d'utiliser un bâtiment neuf, aux derniers standard de production et Hygiène – Sécurité - Environnement.

La direction avait indiqué que le projet ainsi que les investissements nécessaires et le calendrier devaient être travaillés et que le projet serait validé au plus tard en septembre 2014.

Le scénario de la production 2eme semestre 2014 est en cours de consolidation, une vision claire devrait être définie dans les 2 semaines à venir.

B.0

Derniers développements :

Le carnet de commandes prévisionnelles continue d'évoluer favorablement en juin 2014, avec un volume significatif en opportunités de tracteurs towbarless potentiellement à produire en automne 2014 (principalement TPX-200-MT/-MTS/-MTX). Ces opportunités restent pour certaines à confirmer sur l'été.

Le site de MTL ne dispose pas des surfaces suffisantes pour leur réalisation, d'autant plus que nous souhaitons retirer le barnum provisoire pour des questions de conditions de travail (température ambiante).

Des points durs sont à lever quant à l'organisation du flux sur SOR et aux modalités pratiques du transfert. Sur ce deuxième point des études sont en cours entre la Direction, les Instances Représentatives du Personnel, et le personnel pour définir la meilleure organisation possible. Toutefois, il apparaît à peu près clair à ce jour qu'un transfert de l'activité BU MTL en une seule fois n'est pas réalisable.

Version en l'état du projet :

A ce stade, nous envisageons un transfert vers SOR des activités MTL et RH en trois étapes :

- Etape 1 : transfert d'une partie de l'activité à partir de septembre 2014 – Voir ci-après
- Etape 2 : transfert des RH en novembre 2014 (échéance à valider)
- Etape 3 : fin du transfert du reste de l'activité de la BU MTL début 2015 (échéance à valider)

B.O

Projet détaillé du transfert de l'activité « tracteurs conventionnels » à partir de septembre 2014

1. Activité concernée

La production transférée de façon progressive à partir de septembre serait celle des tracteurs conventionnels uniquement.

Les raisons pour lesquelles l'activité des tracteurs towbarless ne serait pas concernée sont principalement :

- Les outillages d'essais opérationnels pour les tracteurs conventionnels sur cette période, a contrario de ceux des tracteurs towbarless
- La peinture des châssis conventionnels sera réalisée dès cette période à SOR, a contrario de ceux des tracteurs towbarless (qui seront réalisés ultérieurement)
- Les flux de pièces magasin nécessaires pour les tracteurs conventionnels sont relativement simples à mettre en œuvre à court terme pour alimenter SOR, a contrario de ceux des tracteurs towbarless (beaucoup plus de diversité, de complexité)

2. Effectif concerné

L'effectif concerné par ce transfert à SOR à partir de septembre serait :

➤ Pour la Production

- 1 Agent de Maîtrise (Assemblage & Peinture)
- 26 Compagnons personnels MTL et intérimaires (Assemblage tracteurs conventionnels)
- 2 contrôleurs
- 1 cariste flux assemblage

➤ Pour la Logistique

- 1 magasinier à SOR (pour la manutention châssis, réception des pièces, besoin de mouvements DTV)

➤ Pour le Bureau d'étude

Le Pôle BE Conventionnel serait également transféré à SOR pour assurer le suivi des tracteurs :

- 1 Responsable du Pôle Tracteurs Conventionnels
- 2 Techniciens BE rattachés aux Tracteurs Conventionnels (personnel MTL ou intérimaires)

➤ Pour la Qualité


- 1 membre du pôle qualité

3. Calendrier prévisionnel

Les productions seraient réalisées à SOR à partir de leur lancement (autrement dit, les tracteurs commencés à MTL ne seraient pas déménagés à SOR), suivant le planning prévisionnel suivant les commandes réellement enregistrées :

Semaine	Evénement	Ressources
36	1 TMX-150 1 TMX-350	1 AM 7 Compagnons 1 Contrôleur 1 Magasinier 1 Membre du pôle Qualité
38	1 TMX-450	+ 4 Compagnons + 1 Cariste flux
39	4 TMX-150	+ 5 Compagnons + 1 Contrôleur + 3 Pôle BE Tracteurs Conventionnels
43	3 TMX-350	+ 10 Compagnons

4. Schéma d'implantation des tracteurs conventionnels à SOR en Automne 2014

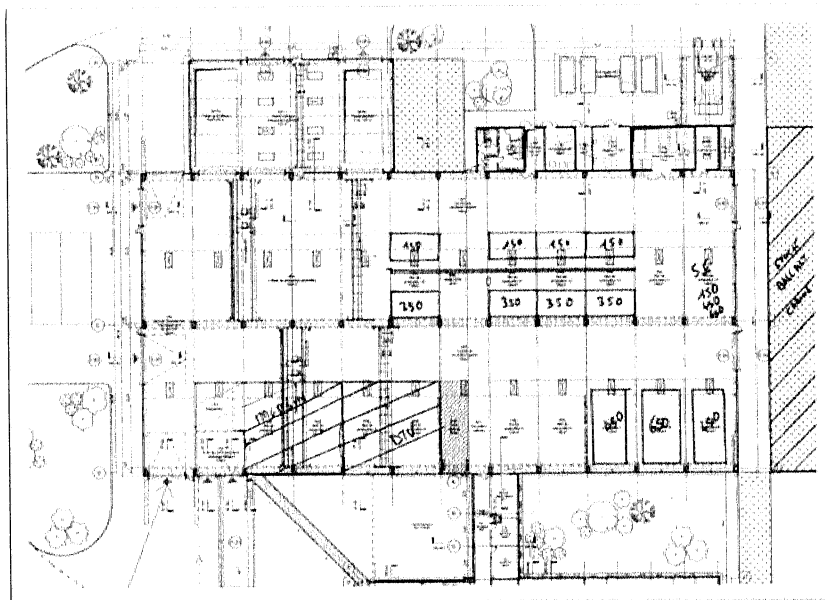

5. Macro organisation flux logistiques pièces magasin

- Pièces volumineuses :
 - o Livraison pièces conventionnels volumineuses directement des fournisseurs à SOR
- Pièces non-volumineuses :
 - o Livraison à MTL pour préparation (idem actuellement)

B.O

- Livraison à SOR via navette
6. Organisation MTL à partir de septembre 2014

L'activité Towbarless sur le site MTL évoluerait de la manière suivante au niveau des ressources :

- Maîtrise
 - 1 Adjoint Agent de Maîtrise serait défini pour une période transitoire afin de prêter main forte aux 3 AM Assemblage demeurant à MTL (personne faisant partie du personnel de production)
- Logistique
 - 1 gestionnaire logistique dédié à la gestion des flux Fournisseurs/MTL/SOR viendrait renforcer l'équipe Supply Chain
 - 1 ressource (a priori nouvelle) assurant les navettes logistiques entre MTL et SOR (pour charger les pièces, les livrer et disposer dans l'atelier + besoins quotidiens)

Les membres du CE émettent en séance des suggestions d'amélioration relatives à cette organisation et expriment le souhait que les employés soient sollicités dans le but de définir les meilleures solutions organisationnelles possibles (ex : organisation des flux magasin, ...).

Ce à quoi la Direction répond très favorablement.

Suite à cette réunion d'information auprès du CE, il est convenu à l'unanimité en séance que le délai légal d'un mois avant la réunion de consultation sera réduit dans l'intérêt de l'information auprès du personnel. La date de la Consultation est ainsi fixée en séance au 10 juillet 2014, soit environ 3 semaines.

*L'ordre du jour est épuisé
Fin de séance*

Olivier BRIER
Secrétaire du CE

Sébastien PARKINSON
Président du CE

